

Proiectul  
“Reforma Învățământului în Moldova”

IP Liceul Teoretic  
“I.L.Caragiale”,  
mun. Orhei

**Perioada implimentării: 06.08.2018- 30.09.2019**

**Compania de construcție: Consit PRO S.R.L.**

**Responsabil tehnic : Grigore Savca**

**• Bugetul proiectului: 12 576 506,10 lei**

# Termenul de execuție


**28.06.2019**

Din motivul că pentru eliberarea sălilor de clasă din blocuri de mobilier și echipament și necesitatea de elaborare a unui proiect pentru acoperișul de pe blocul D beneficiarul a solicitat o extindere a termenului de execuție a lucrărilor pînă pe data de


**30.09.2019**

# Volume executate și achitate

## Executarea lucrărilor

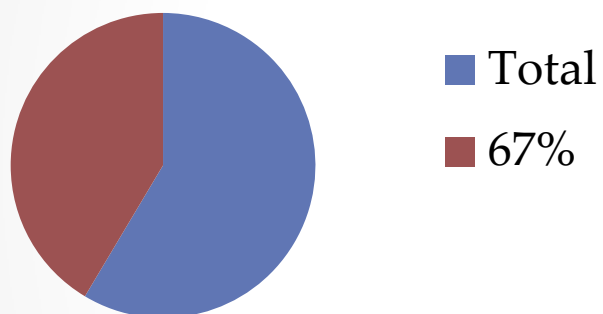

## Executarea de timp

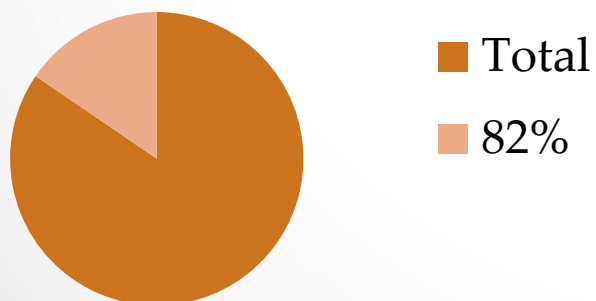


## 1. Volume de lucrări incluse pentru toate blocurile A, B, C, D,:


- Acoperiș.
- Termoizolarea fațadelor
- Crearea căilor de acces pentru copii cu nevoi speciale.
- Uși interioare.
- Sistem de încălzire intern și extern.
- Tavane și pardoseli.
- Amenajarea teritoriului.

# Volume executate și achitate

## Executarea lucrărilor

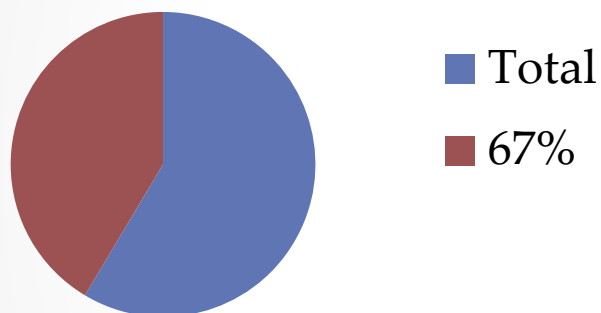

## Executarea de timp

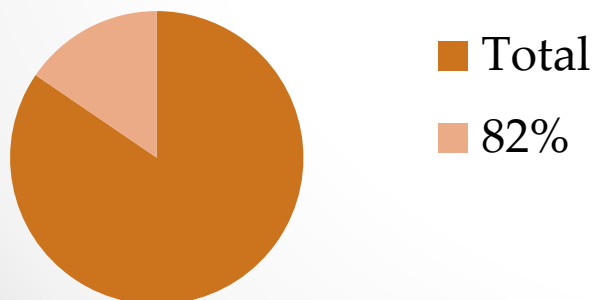


## 2. Volume de lucrări incluse pentru blocul C:

- **Rețele de apă/caldă și canalizare interioare și exterioare.**
- **Sistem de încălzire.**
- **Rețele electrice interioare și exterioare.**
- **Rețele de ventilare forțată la blocurile sanitare.**
- **10 blocuri sanitare inclusiv 4 pentru copii cu dizabilități.**
- **Reparație pereți tavane și pardoseli.**
- **Amenajarea teritoriului.**

# Până la începutul proiectului






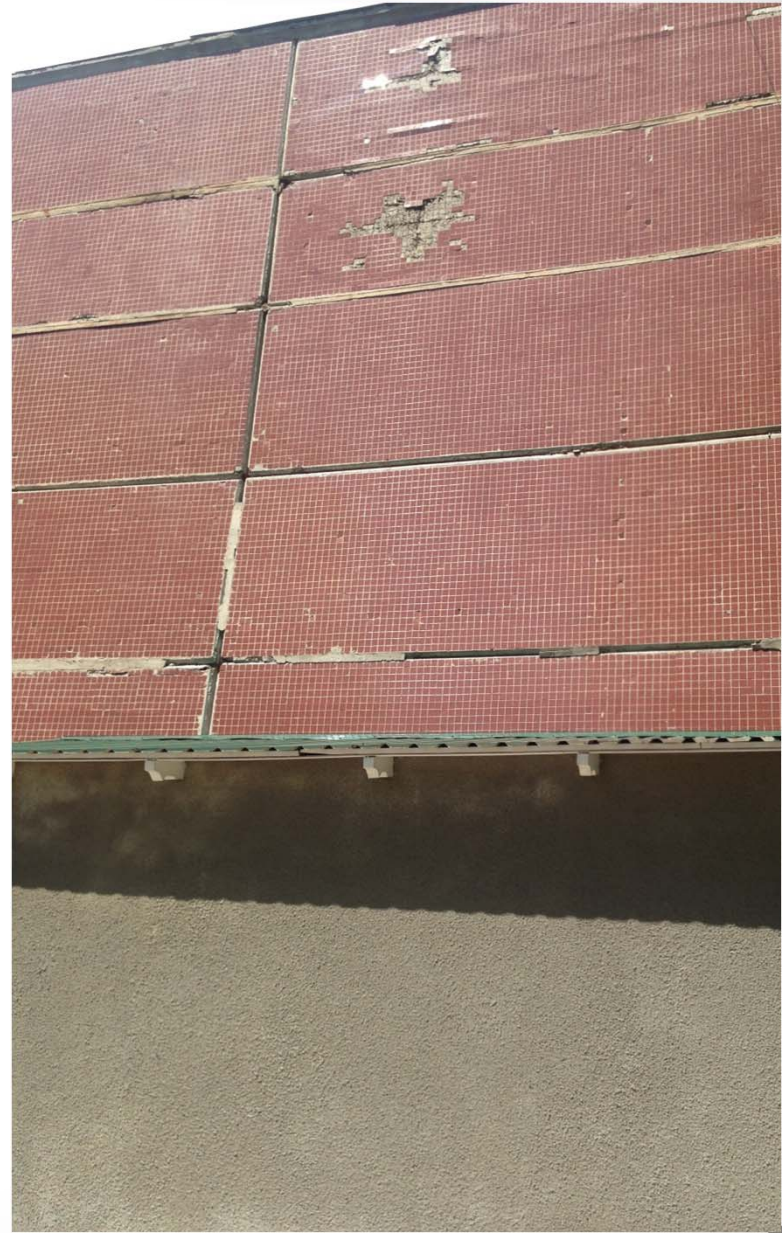








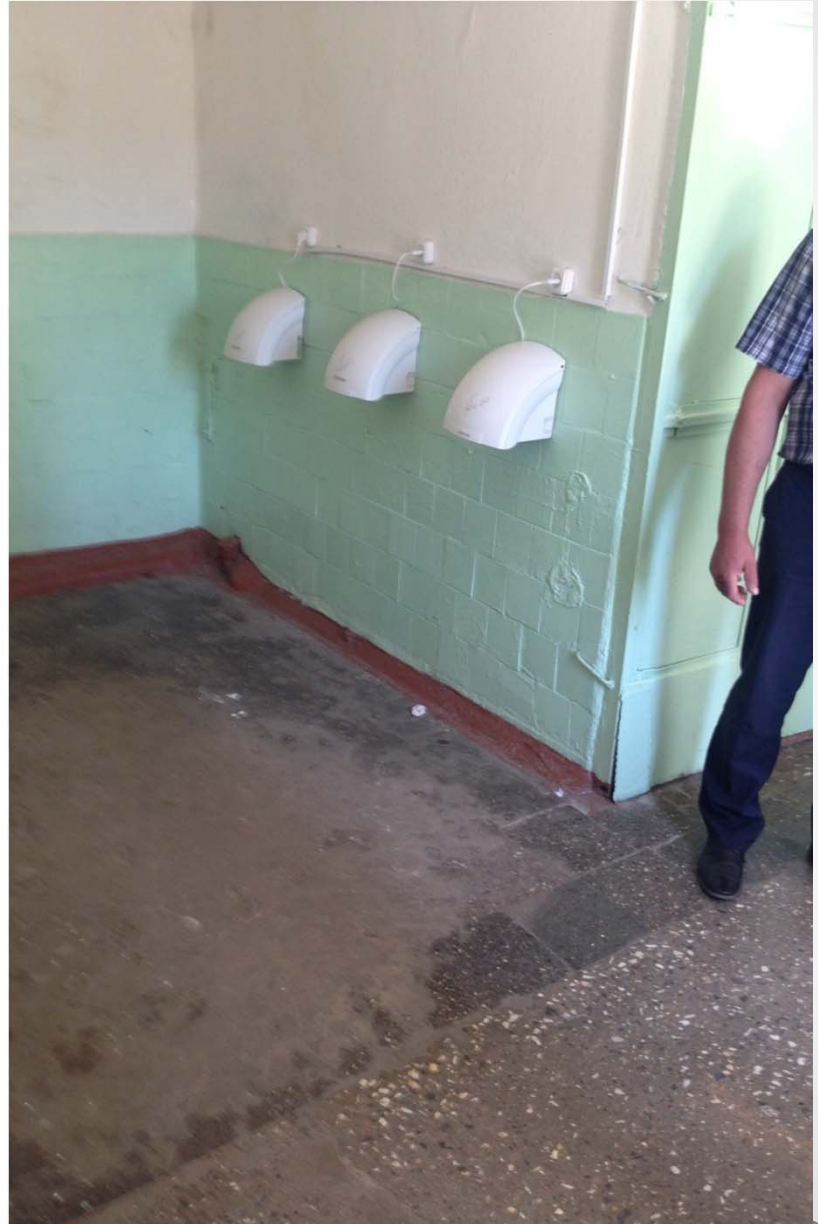


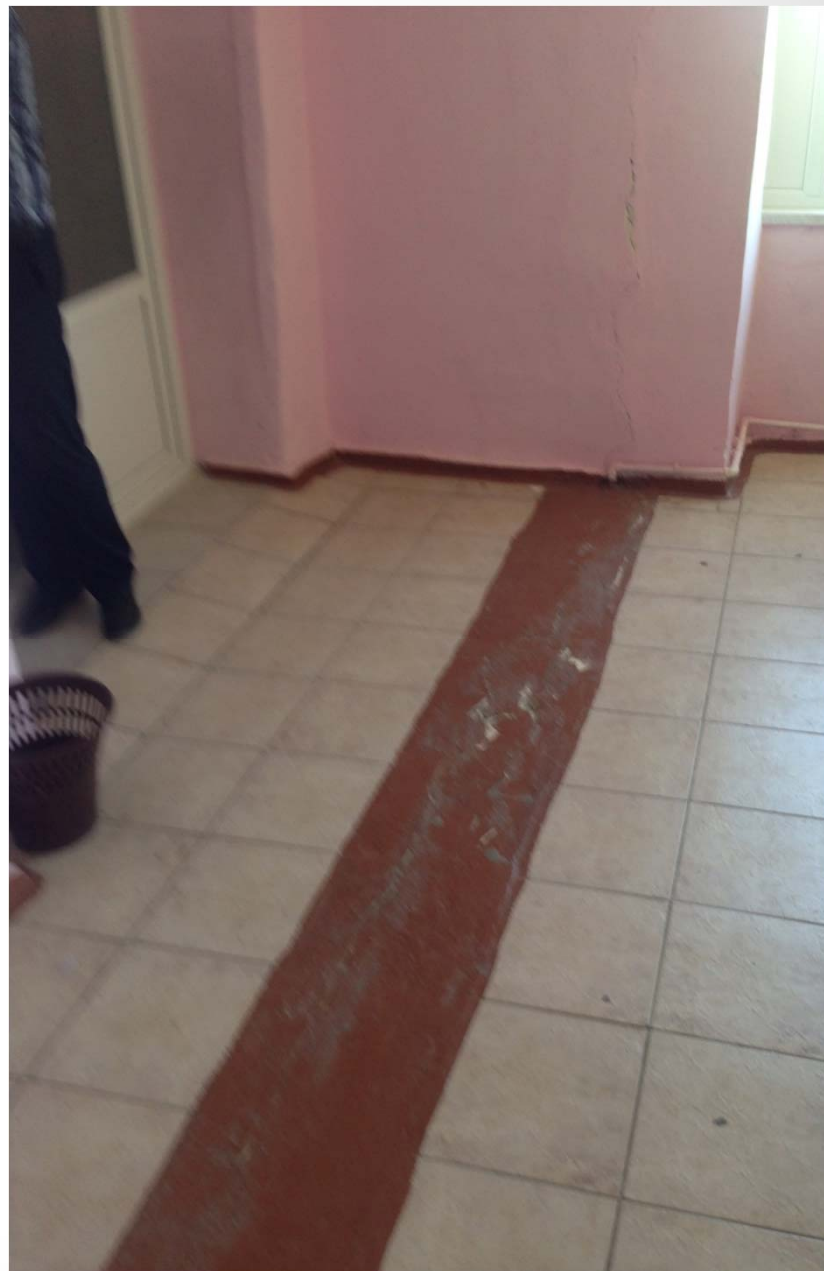


# După executarea lucrărilor







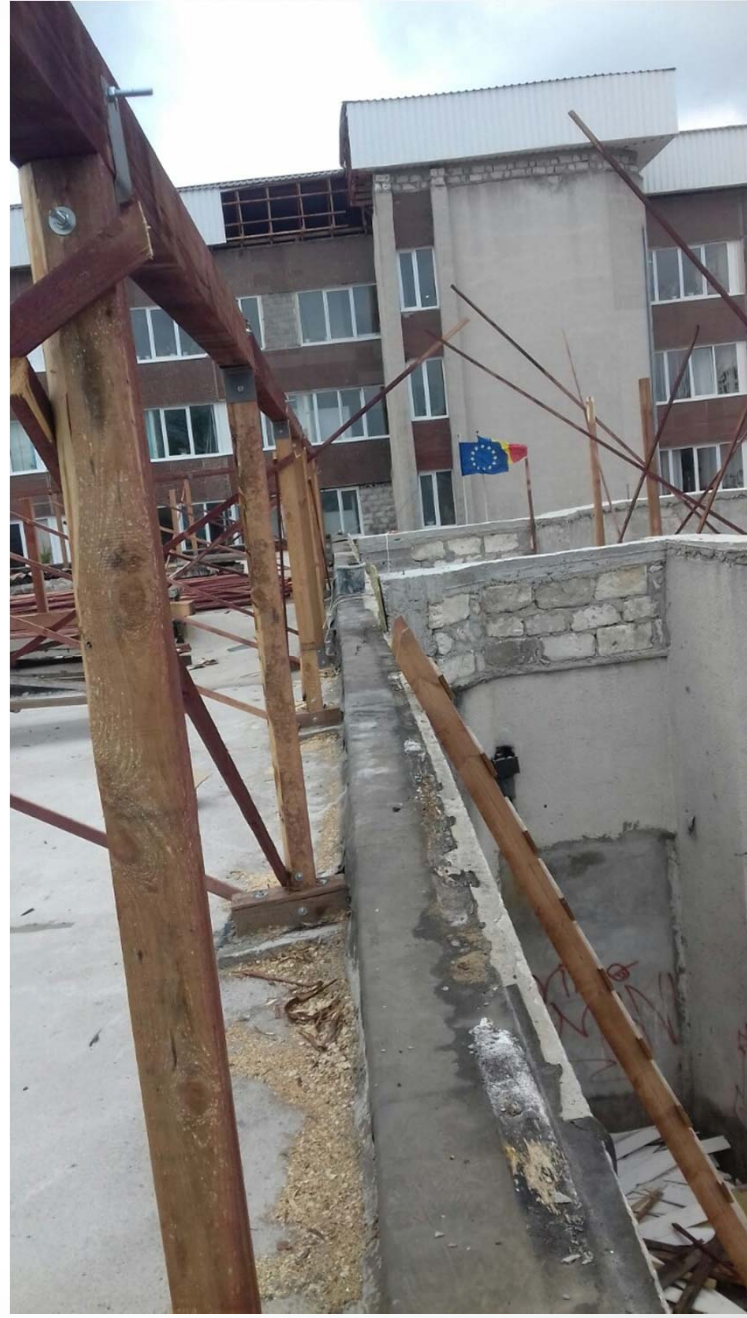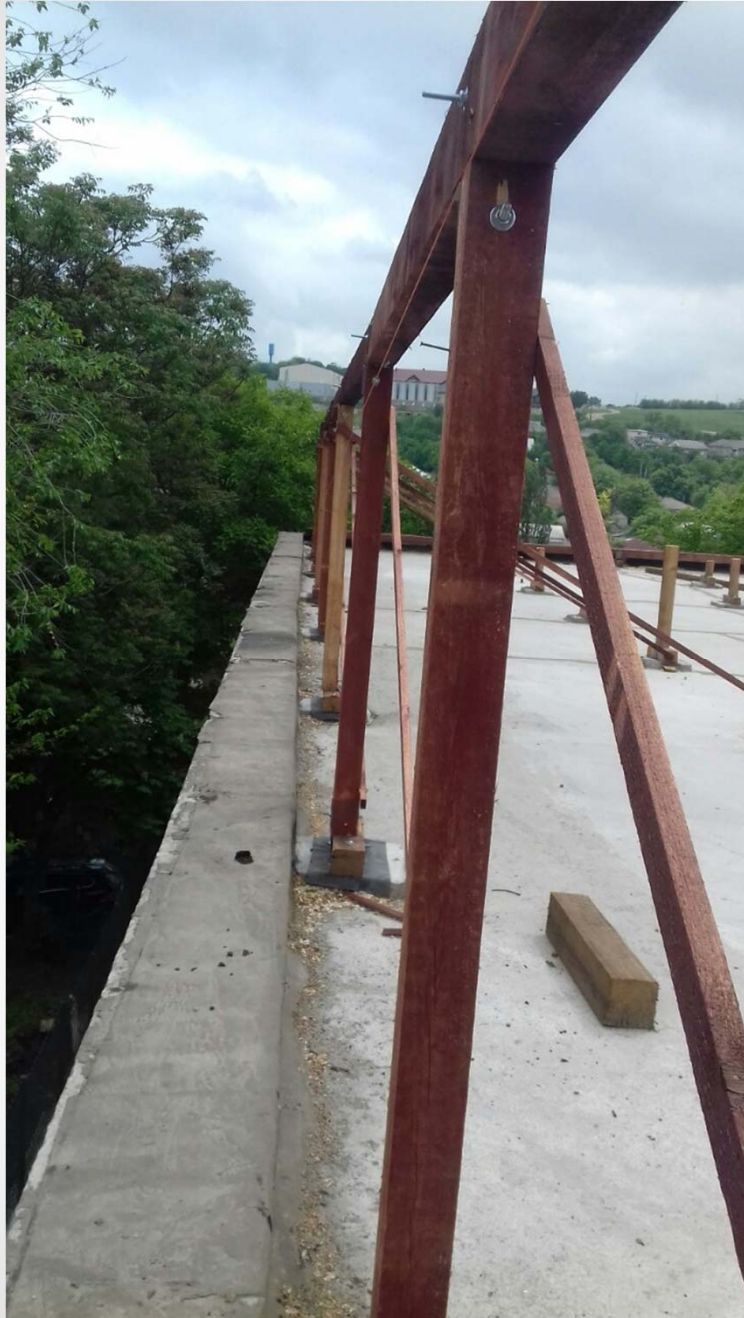









## **Probleme la etapa de implementare care au adus la extinderea termenului de executare a lucrărilor:**

1. Modificarea deciziei tehnice la acoperișul de pe blocul D.
2. În perioada implementării sub-proiectului beneficiarul a luat decizia să execute rețelele electrice interioare din contul Consiliului Raional în cadrul proiectului.
