

Proiectul  
“Reforma Învățământului în Moldova”

IP Liceul Teoretic  
“A. Pușkin”,  
mun. Ungheni

**Perioada implimentării: 30.05.2018- 20.07.2019**

**Compania de construcție: FPC Agentinter S.R.L.**

**Responsabil tehnic : Iacob Mihailov**

**Costul lucrărilor – inițial: 10 795 000,00 lei**

+745 846,52 lei

+687 223,50 lei

**– final: 12 228 065,55 lei**


# Termenul de execuție

28.06.2019


**La data de 31.07.2019 a avut loc sesiunea  
Comisiei de recepție finală a lucrărilor**

# Volume executate și achitate

## Executarea lucrărilor




## Executarea de timp

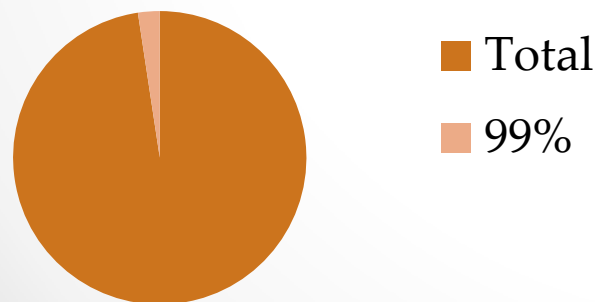


1. Acoperiș la toate blocurile.
2. Ferestre și uși exterioare la toate blocurile.
3. Termoizolarea fațadelor la toate blocurile.
4. Crearea căilor de acces pentru copii cu nevoi speciale.

# Volume executate și achitate

## Executarea lucrărilor



## Executarea de timp

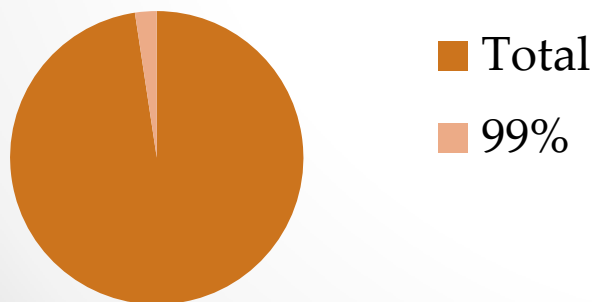

## 5. Reparații interioare integrală pe următoarele compartimentele la blocul de studii A:

- Sistem de încălzire.
- Uși interioare
- Rețele de apă rece/caldă și canalizare.
- Rețele electrice interne și externe.
- Rețele de ventilare forțată la blocurile sanitare.
- 9 blocuri sanitare inclusiv unul pentru copii cu dezabilități.
- Reparație pereți tavane și pardoseli.

# Până la începutul proiectului















# După executarea lucrărilor







2019-4-25 10:38





2019-4-25 11:07



2019-4-25 10:35
