

Proiectul
“Reforma Învățământului în Moldova”


IP Liceul Teoretic
”Alexandru cel Bun”
or. Rezina

Perioada implimentării: 16.07.2018- 30.04.2019

Bugetul proiectului: 908 730,00 lei

Volume executate și achitate

Executarea lucrărilor

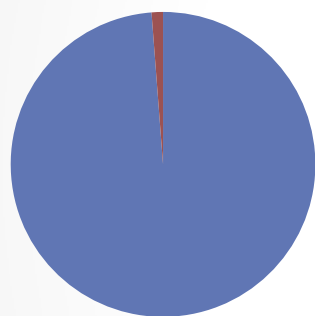

■ Total

■ 98%

Executate - ridicare topografică, măsurări pe planimetrie și coordonările cu beneficiarul cu prestatorii de servicii , apă și canalizare, electrice.

Unele compartimente sunt la verificare și expertizare.

Se elaborează devizul de cheltuieli pe compartimentele prezentate.

Tema de proiectare

- Sistematizarea teritoriului pe verticală pentru evacuarea apelor pluviale;
- Amenajarea căilor de acces (conform normativelor) ;
- Reparația blocurilor sanitare, inclusiv pentru copii cu dizabilități;
- Rețelele de apă (rece și caldă)
- Rețelele de canalizare interioară și exterioară;
- Stația de epurare;
- Sistemului de încălzire;
- Rețeaua termică exterioară, conectată la două centrale termice (pe bază de gaze naturale și peleți) ;

Tema de proiectare

- Rețelele interioare de aprovizionare cu energie electrică;
- Sistemul de semnalizare antiincendiară și de pază;
- Sistemului de ventilare (local) (blocuri sanitare, cantină-bucătărie, săli sportive, sala festivă, laboratoare);
- Pentru ventilarea încăperilor, de prevăzut clapete, montate în blocurile de fereastră;
- Articole de tâmplărie interioară;
- Finisarea interioară (pereți, tavane, pardosele);
- Amenajarea teritoriului.

Tema de proiectare

- Prospekțiuni ingineresti (cercetări geologice și geodezice);
- Organizarea șantierului;
- Elaborarea devizelor;
- Verificarea documentației de proiect.

**Cauza încălcării graficului de elaborare
a proiectului de execuție –
fluctuația cadrelor**



Până la începutul proiectului



























