

Proiectul
“Reforma Învățământului în Moldova”

IP Liceul Teoretic
“Vasile Coroban”,
or. Glodeni

Perioada implimentării: 18.07.2018- 20.07.2019

Compania de construcție: FPC Agentinter S.R.L.

Responsabil tehnic : Vasile Varzari

• Bugetul proiectului: 11 581 208,72 lei


Termenul de execuție

Consiliul Raional Glodeni și Agenția de Implementarea motivează extinderea prin lipsa documentației de proiect la conectarea rețelelor de aprovizionare cu energie electrică și ventilare a sălilor: festivă, sport, de mese și bucătăriei. Compania de proiectare amână prezentarea documentației de proiect corectată.


Se propune convocarea Comisiei de recepției finală a lucrărilor de construcții la **28.08.2019**. Direcția instituției garantează neîntreruperea procesului de studii începând cu 01 septembrie 2019.

Volume executate și achitate

Executarea lucrărilor

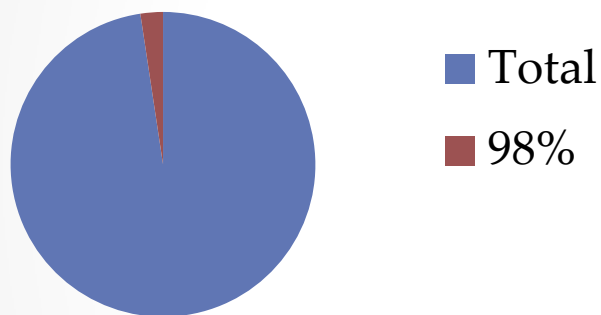


Executarea de timp

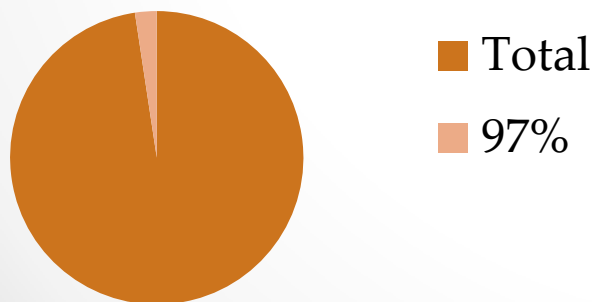


1. Acoperiș la toate blocurile.
2. Ferestre și uși exterioare la toate blocurile parțial (100m² care nu au fost montate de beneficiar).
3. Reutilizarea centralei termice cu cazane noi.
4. Crearea căilor de acces pentru copii cu nevoi speciale.
5. Reparații interioare integrală pe următoarele compartimentele la blocul de studii B:

Volume executate și achitate

Executarea lucrărilor

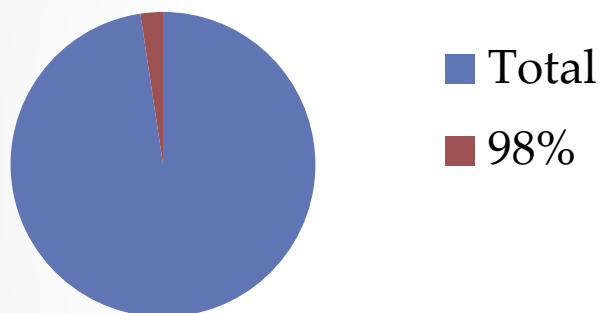


Executarea de timp

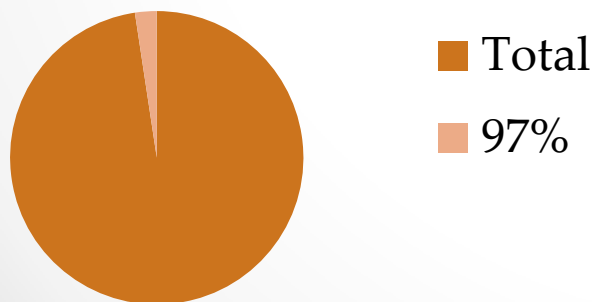


- Sistem de încălzire intern și extern
- Rețele de apă rece/caldă și canalizare internă și externă.
- Rețele electrice interne și externe.
- Rețelele internet, sonerie sistemul anti-incendiar .
- Rețele de ventilare forțată la blocurile sanitare.
- 12 blocuri sanitare inclusiv unul pentru copii cu dezabilități.
- Reparație pereți tavane și pardoseli.

Volume executate și achitate

Executarea lucrărilor

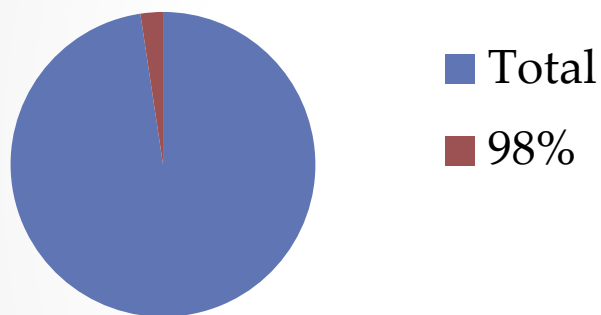

Executarea de timp

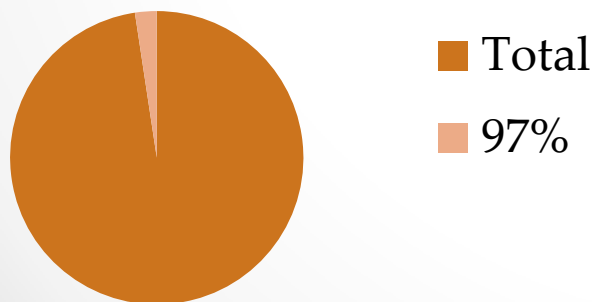

6. Reparații interioare blocul alimentar, sala sport și sala festivă pe următoarele compartimentele la blocul de studii A:

- Sistem de încălzire.
- Rețele de apă rece/caldă și canalizare.
- Rețele electrice interne și exterioare.
- Rețele de ventilare forțată la blocurile sanitare și blocul alimentar.
- 1 blocur sanitar.
- Reparație pereți tavane și pardoseli.

Probleme la etapa implimentarii

În perioada implementării Sub-proiectului Consiliul raional Glodeni în parteneriat cu Consiliul județean - Bistrița Năsăud a atras o investiție de circa **4 000 000, 00 lei** pentru reabilitarea liceului.

Din acest motiv va fi necesar de verificat, eventual de modificat volumele de lucrări pentru delimitarea hotarelor de executare a lucrărilor, atât volumetric cât și tehnologic, fapt care a cauzat extinderea termenului de executare a lucrărilor cu circa **1 lună**.

Până la începutul proiectului















După executarea lucrărilor





























