



GUVERNUL ROMÂNIEI

**FISM**

FONDUL DE  
INVESTIȚII  
SOCIALE DIN  
MOLDOVA



GUVERNUL  
REPUBLICII MOLDOVA

# RAPORT DE PROGRES

**privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova  
August 2014 - Iunie 2015**

FONDUL DE INVESTIȚII SOCIALE DIN MOLDOVA

CHIȘINĂU, 2015

## CUPRINS

I. INTRODUCERE.....	2
II. SUMAR EXECUTIV .....	4
III. ACTIVITATEA FISM .....	5
IV. ACTIVITATEA COMITETULUI DE EVALUARE FISM .....	6
V. LUCRĂRI CIVILE .....	7
VI. BUNURI .....	8
VII. CONCLUZII ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE.....	9
Anexa 1. Terenurile de joacă licitate .....	11
Anexa 2. Mobilierul licitat .....	12
Anexa 3. Pavilionul licitat .....	13
Anexa 4. Realizări în imagini.....	14

## I. INTRODUCERE

**Strategia Sectorială de Dezvoltare a Educației pentru anii 2014–2020** este principalul document de politici în domeniul educației. Strategia stabilește obiectivele și sarcinile pe termen mediu în vederea dezvoltării educației și definește orientările și direcțiile prioritare de dezvoltare a sistemului de învățământ din Republica Moldova. Unele din obiectivele generale ale Strategiei sunt:

**(i) asigurarea dezvoltării durabile a sistemului educațional** în vederea formării unei personalități integre, active, sociale și creative – factori principali ai dezvoltării umane și ai progresului social-economic al țării;

**(ii) sporirea accesului la educație de calitate pentru toți copiii și tinerii**, prin asigurarea unui mediu școlar prietenos și protectiv și prin consultarea beneficiarilor în procesul de luare a deciziilor;

Accesul copiilor de vîrstă timpurie la educație crește într-un ritm susținut, dar rețeaua existentă de grădinițe acoperă doar o parte din cerere. Se menține discrepanța dintre rata înrolării în mediul urban și în cel rural. Numărul instituțiilor preșcolare este în creștere, după scăderea dramatică în perioada de recesiune din anii '90. La începutul anului 2013, existau 1418 instituții preșcolare, sau cu circa 6,3% mai multe față de anul 2007. Această creștere a avut ca rezultat majorarea numărului de copii care frecventează aceste instituții pînă la 141,1 mii de copii în anul 2012, cu 17,5% mai mult față de anul 2007. Astfel, se înregistrează o sporire a ratei brute de cuprindere în învățământul preșcolar, aceasta constituind 82,1% în anul 2012 față de 72,6% în anul 2007. **Discrepanțele dintre rata de cuprindere în mediul urban și cea din mediul rural persistă, constituind 29,1 p.p. în 2012 comparativ cu 25,2 p.p. în 2007<sup>1</sup>.** Deși o parte din această discrepanță poate fi explicată prin înrolarea copiilor din locuri de reședință rurale în grădinițele din localitățile urbane, diferența rămîne a fi semnificativă.

**În baza ORDINULUI nr. 913 din 10 aprilie 2014, emis de Ministerul Afacerilor Externe al României**, privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2014, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la București și la Chișinău la 9 aprilie 2014, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, referitor la implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, **a fost aprobată spre finanțare o listă de proiecte pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova.**

**În baza HOTĂRÎRII Nr. 436 din 10.06.2014, emise de Guvernul Republicii Moldova**, Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM) este desemnat drept entitatea responsabilă de pregătirea, implementarea, asigurarea vizibilității și raportarea **Programului de asistență tehnică și financiară**

<sup>1</sup> Educația în Republica Moldova, publicație statistică, 2012/2013

**acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova, în valoare totală de 20 000 000 Euro.**

Prin decizia Consiliului Național de Administrare (procesul-verbal nr.2 din 23 iunie 2014) a fost creat Comitetul de evaluare FISM și aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al acestuia în vederea evaluării licitațiilor realizate în cadrul Programului menționat.

## II. SUMAR EXECUTIV

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.436 din 10.06.2014 privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova, **beneficiari** ai acestui Program sînt **774 de instituții precolare, dintre care - 757 cu acorduri și contracte semnate și 17 în proces de evaluare/suprapunere sau licitație.**

Ca urmare a aprobării Structurii, Bugetului și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de evaluare FISM au fost realizate mai multe activități în vederea implementării Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova.

Au fost evaluate (obiectele inspectate de inginerii FISM și elaborate devizele de cheltuieli) **624 obiecte** – instituții preșcolare beneficiare de resurse financiare din grantul menționat, au fost instruite peste 2000 de persoane cu privire la procedurile de procurare și implementarea contractelor cu privire la lucrări civile (reprezentanți ai APL-urilor beneficiare, manageri de instituții preșcolare și agenților de implementare), au fost desfășurate și evaluate peste **532 de licitații** desfășurate de primăriile satelor și/sau comunelor, consiliile raionale și semnate **624 contracte pentru realizarea lucrărilor civile**, din care **319 sau 51% deja finalizate cu succes.**


*În 98% din instituțiile preșcolare beneficiare din cadrul Grantului oferit de Guvernul României demarează lucrările civile și/sau se livrează bunuri*

Suma totală contractată la 30.06.2015 pentru realizarea lucrărilor civile și livrarea de bunuri este de 351 395 331.41 MDL sau 18 994 342 Euro, din care 288 565 062.32 MDL sau 15 598 111,5 Euro au fost contractate pentru realizarea lucrărilor civile, iar 62 830 269.09 MDL sau 3 396 230 Euro – contractate bunuri.

Respectiv, din totalul sumei disponibile din grant pentru lucrări civile și bunuri **peste 82% au fost deja contractate.**

Pînă la finele lunii iunie curent suma valorificată a Grantului a constituit 203 067 911.01 MDL sau 10 224 761.02 Euro, ceea ce reprezintă **58%** din suma total contractată.

Fig.1. Realizarea Grantului acordat de Guvernul României

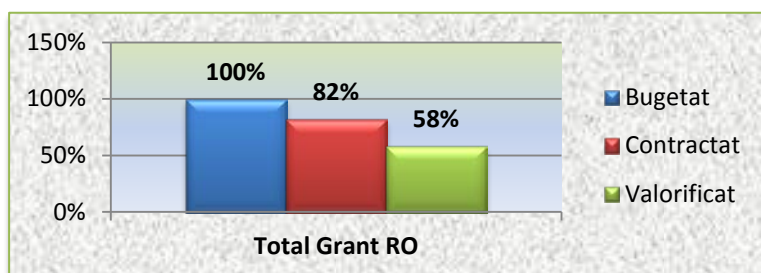

**426 de comunități** au solicitat bunuri (mobilier, terenuri de joacă și pavilioane) în valoare totală de **62 830 269,09 MDL sau 3 396 230 Euro**, rata de executare a contractelor pe **bunuri fiind de 60%.**

## III. ACTIVITATEA FISM

În vederea implementării **Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova**, în valoare totală de 20 000 000 Euro, angajații FISM au acordat suport tehnic la evaluarea lucrărilor civile necesare în cele 774 de instituții preșcolare și elaborarea devizelor de cheltuieli pentru **624** obiecte, celelalte beneficiind doar de bunuri.

Pentru a asigura buna desfășurare a licitațiilor de către autoritățile publice locale, au fost **instruite peste 1500 de persoane** în domeniul organizării și desfășurării unei licitații în conformitate cu regulile și procedurile de procurări stipulate în Manualul Operațional FISM.

Ca rezultat al acestor instruirii, au fost desfășurate în total **532 de licitații, din care 419 de licitații validate și aprobate de către Comitetul de evaluare FISM.**

Prin decizia Consiliului Național de Administrare al FISM din 16 septembrie 2014, a fost aprobată o procedură nouă de organizare a licitațiilor și anume organizarea licitațiilor pe lot, pentru a ușura activitatea FISM și a urgenta demararea lucrărilor civile în cadrul instituțiilor preșcolare beneficiare.


Din 532 de licitații – **83 de licitații au fost organizate pe lot**, dintre care doar 11 au fost reanunțate/anulate, acestea demonstrându-și pe deplin aplicabilitatea și eficiența, urgentând procesul de contractare și demarare a lucrărilor de construcție în instituțiile preșcolare.

Pe parcursul lunilor August 2014-Iunie 2015, au fost **semnate 1034 de Acorduri de Grant** între FISM și APL de nivelul I cu privire la implementarea sub-proiectelor (**597 pentru lucrări civile/reconstrucții, 17 prin Comunity Driven Development** (transfer direct a mijloacelor financiare, acestea fiind aprobate nominal de către Consiliul Național de Administrare a FISM) și **420 pentru bunuri**).Fig.2.

Fig.2. Acorduri de Grant semnate între primării și FISM

Pentru asigurarea bunei implementări a contractelor de lucrări civile semnate între primării și prestatorii de servicii de construcții s-au organizat peste **35 seminare de informare cu participarea a peste 1500 de persoane** (primari, directori Agențiilor de Implementare și


contractorii) cu scopul de a le explica toate condițiile contractuale, aspectele tehnice și financiare care pot apărea, în vederea excluderii situațiilor neclare în implementarea contractelor pe viitor.

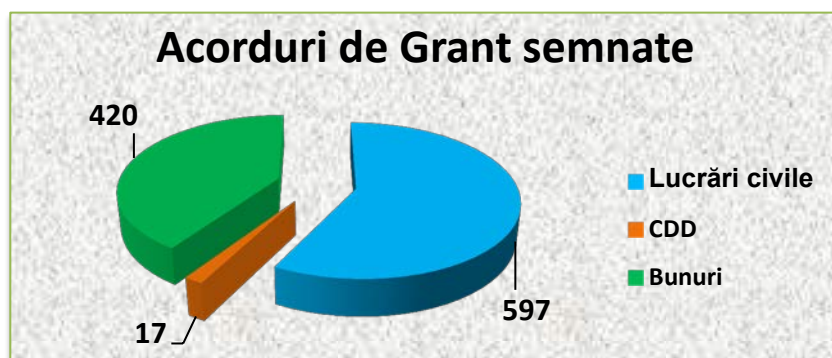

## IV. ACTIVITATEA COMITETULUI DE EVALUARE FISM

Pe parcursul lunilor august 2014 - iunie 2015 Comitetul de evaluare FISM s-a întrunit de 23 ori, **examinând 532 de licitații** organizate la nivel local, din care: 79% - validate și aprobate, 14% - transmise spre reexaminarea ofertelor și a deciziilor, 6,8% - licitații anulate și transmise la reanunțare – Fig.3.

Fig.3. Licitatiile examinate de Comitetul de evaluare FISM

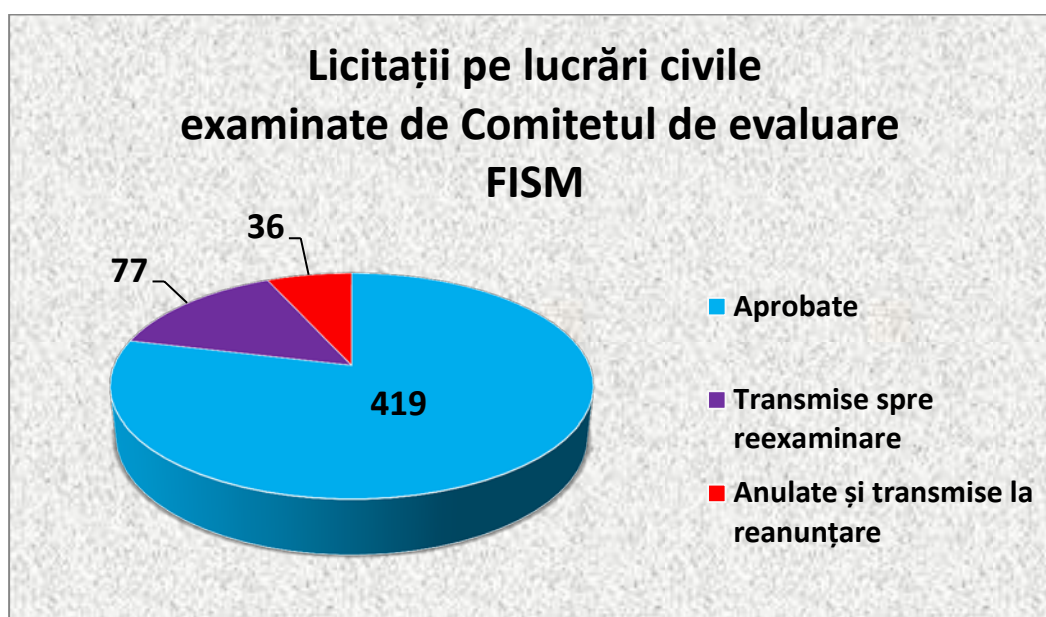

Totodată, au fost organizate și desfășurate 6 licitații de bunuri de către Comitetul de evaluare FISM în vederea selectării companiilor pentru fabricarea mobilierului, furnizarea și instalarea terenurilor de joacă și a pavilioanelor pentru instituțiile preșcolare beneficiare de asistența financiară disponibilă în cadrul *Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova*.

Ca urmare a licitațiilor desfășurate și examinate de către Comitetul de evaluare FISM, au fost semnate contracte pe bunuri în valoare totală de **72 077 726 MDL**, din care **961 886,91 MDL reprezintă contribuțiile comunităților**.

*În cadrul a 23 de ședințe ale Comitetului de evaluare FISM au  
fost examinate 532 de licitații, ceea ce în medie reprezintă  
circa 23 de licitații examinate per ședință*


## V. LUCRĂRI CIVILE

În perioada de raportare FISM a acordat suport la elaborarea a **624 devize de cheltuieli** pentru realizarea lucrărilor civile.

Din total devize de cheltuieli elaborate, au fost contractate lucrări civile pentru **597 de grădinițe de copii**, ceea ce reprezintă **96% din volumul total**.

La ziua de 30 iunie 2015 **deja au fost finalizate lucrările de reparație la 306 de instituții**, iar suma valorificată în total pentru lucrări civile constituie **168 664 979,87 MDL**, ceea ce reprezintă **58% din suma total contractată de 288 565 062,32 MDL**, echivalentul a **15 598 111,48 Euro**.

Fig. 4. Valorificarea resurselor disponibile pentru lucrări civile

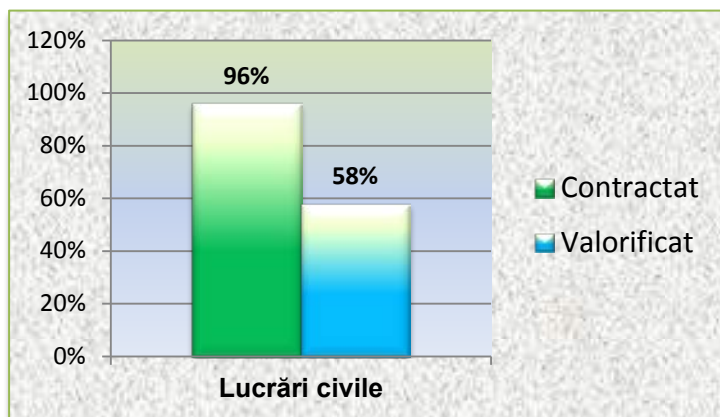

La realizarea contractelor de lucrări civile și reconstrucții FISM acordă tot suportul tehnic necesar, asigură monitorizarea și evaluarea calitativă a acestora.

Majoritatea contractelor semnate se estimează a fi finalizate deja pînă la data de **30 septembrie 2015**.

Drept probleme majore în procesul de implementare a contractelor de lucrări civile menționăm următoarele:

- Luînd în considerație situația instabilă pe piața valutară din Republica Moldova care a avut loc în perioada de raportare, implementarea multor sub-proiecte a fost tărăgănată în timp, iar circa 5% din contracte au fost reziliate din cauza diferenței de preț la materialele de construcție din perioada de licitație și cele actuale.
- Totodată, circa 24 de obiecte nu pot fi implementate la moment din cauza lipsei contribuției locale pe care comunitatea s-a angajat să o transfere. Astfel, suma contribuției restante la data raportării constituie 3 084 139 MDL, care nu permite valorificarea sumei contractate din Grantului oferit de Guvernul României în valoare totală de 10 236 186,78 MDL.

## VI. BUNURI

Pentru a asigura instituțiile preșcolare cu bunuri (426 de instituții beneficiare de bunuri), FISM a organizat 6 licitații centralizate pentru procurarea și asamblarea/instalarea mobilierului, pavilioanelor și echipamentelor pentru terenul de joacă, cu semnarea ulterioară a contractelor în valoarea totală de 72 077 726 lei.


Primele 3 contracte în valoare totală de 22 077 726 MDL au fost executate integral, asigurând 121 de instituții preșcolare cu bunurile solicitate.

Pentru a asigura celelalte instituții preșcolare, în care prioritar era realizarea lucrărilor civile, după finalizarea acestora, au fost desfășurate licitații noi pentru fabricarea mobilei, furnizarea și instalarea pavilioanelor și a terenurilor de joacă cu publicarea anunțurilor în Monitorul Oficial.

Ca urmare a licitațiilor desfășurate în lunile ianuarie-februarie 2015, au fost semnate contracte-cadru în valoare totală de 50 000 000MDL.

Numărul beneficiarilor acestor contracte-cadru crește treptat odată cu finalizarea lucrărilor de reparație în instituțiile preșcolare și clarificarea sumei restante, disponibilă din *Hotărârea Guvernului 436 din 10.06.2014 pentru aprobarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova*. La data raportării avem 305 beneficiari care au solicitat bunuri în valoare totală de 63 792 156 MDL din care 62 830 269,09 MDL – reprezintă suma disponibilă din Grantul oferit de Guvernul României, iar 961 886,91 MDL - reprezintă contribuția comunității.

Procentul realizării contractelor pe bunuri se prezintă după cum urmează:

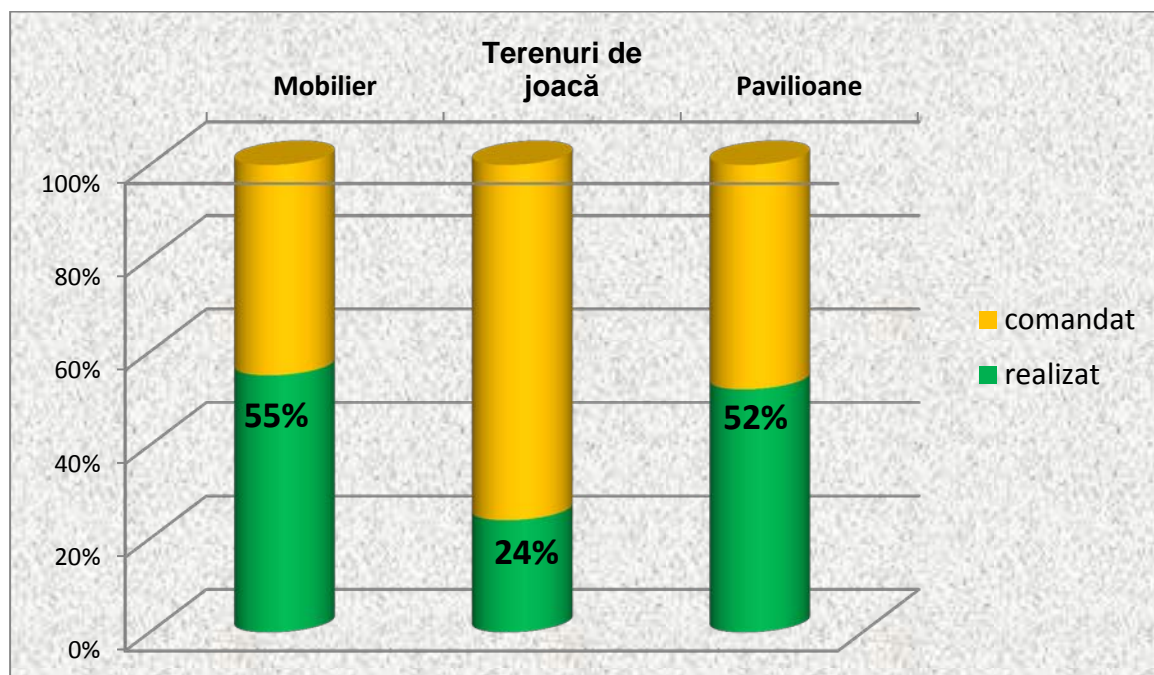

Modele bunurilor procurate sînt prezentate în Anexa nr.1, 2 și 3

## VII. CONCLUZII ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE

Realizarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova, în valoare totală de 20 000 000 euro **se consideră a fi bună**, dat fiind numărul mare de licitații, lucrări civile și furnizări de bunuri lansate concomitent, precum și luînd în considerație schimbările efectuate în managementul instituției, resurse umane limitate în cadrul FISM, dar și timpul restrîns pentru implementarea unei sume considerabile, grantul fiind disponibil pentru valorificare începînd cu luna August 2014, după promulgarea amendamentului la Legea bugetului 2014.

Riscurile cu care a fost lansată realizarea Grantului respectiv și de care FISM era conștient, au fost minimizate la maxim prin acțiuni concrete și anume:

RISCOL	ACȚIUNI DE MITIGARE
Capacități insuficiente la nivelul comunităților de a evalua calitativ volumele de lucrări pentru care se solicită investiții și prioritizarea acestora	A fost acordată asistența tehnică la evaluarea repetată a tuturor obiectelor beneficiare de investiții din Grantul acordat de Guvernul României
Numărul mare de licitații anunțate concomitent ar putea cauza un deficit de ofertanți, fapt care ar genera licitații nevalide. Respectiv, comunitățile beneficiare de bugete mici (50-300 mii lei) ar putea fi impuse de a anunța licitații repetate, ceea ce tîrîgănează procesul de implementare a Grantului	A fost propusă Consiliului Național de Administrare și aprobată de către acesta modalitatea organizării licitațiilor pe loturi, pentru a micșora numărul de licitații și a minimiza riscul de a genera licitații nevalide
Contractorii ar putea întîrzia cu realizarea lucrărilor de reparație din cauza condițiilor climatice nefavorabile din perioada toamnă-iarnă curent	A fost propusă contractorilor utilizarea adaosurilor chimice, plastifcatorilor, materialelor și tehnologiilor ce pot permite executarea lucrărilor în perioada rece a anului
Lipsa resurselor financiare necesare pentru realizarea de către FISM a evaluărilor lucrărilor de reparație, înainte de orice transfer bănesc către contractor, pune sub pericol controlul calității lucrărilor executate	S-a obținut finanțare adițională pentru acoperirea cheltuielilor de evaluare și asigurarea controlului lucrărilor civile executate

**LECȚIILE ÎNVĂȚATE** pe parcursul implementării *Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova* au fost următoarele:

1. Lipsa competitivității în cazul în care fondurile sînt din start repartizate prin Hotărîre de Guvern și nu necesită eforturi suplimentare din partea comunităților pentru atragerea investițiilor duce la pasivitate și neimplicare a acestora în perioada de implementare a investițiilor. **FISM urmează să promoveze în continuare întregul ciclu de acordare și implementare a investițiilor pentru stimularea competitivității în rîndurile potențialilor beneficiari.**
2. Lipsa conlucrării la nivel de APL I și APL II în cazul organizării licitațiilor pe loturi a dus la tărăgănarea întregului ciclu de implementare a subproiectelor și, respectiv, valorificarea surselor financiare. **În cazul organizării licitațiilor pe lot e necesar examinarea ex-ante a gradului de colaborare între APL I și APL II și consultarea beneficiarilor apriori lansării licitației pe lot.**

## Anexa 1. Terenurile de joacă licitate

1. Balansoar - 6 773 lei



2. Balansoar cu arc – 12 235 lei



3. Balansare pe arc – 7 482 lei



4. Figurina pe arc – 6 870 lei



5. Echipament pe arc elicoidal – 6 870 lei



6. Leagan – 6 027 lei




7. Leagan dublu – 12 129 lei



8. Tobogan simplu – 10 228 lei



9. Nisipiera – 6 196 lei



10. Complex cu 1 tob. – 25 908 lei



11. Complex cu 3 tob. – 116 429 lei



12. Complex cu 2 tob. – 53 164 lei



13. Complex de joaca cu 2 turnuri și 3 tobogane – 67 164 lei



## Anexa 2. Mobilierul licitat



Dulap pentru haine – 1600 lei



Dulap pentru ștergare – 300 lei




Pat pentru copii 3 nivele – 1800 lei



Etajeră pentru cărți și jucării – 470 lei



Etajeră cu 5 polițe – 610 lei



Pat simplu pentru copii – 570 lei



Scaun pentru copii – 120 lei



Un set din 3 mese (8 locuri) – 690 lei



## Anexa 3. Pavilionul licitat



## Anexa 4. Realizări în imagini



# RAPORT DE PROGRES



